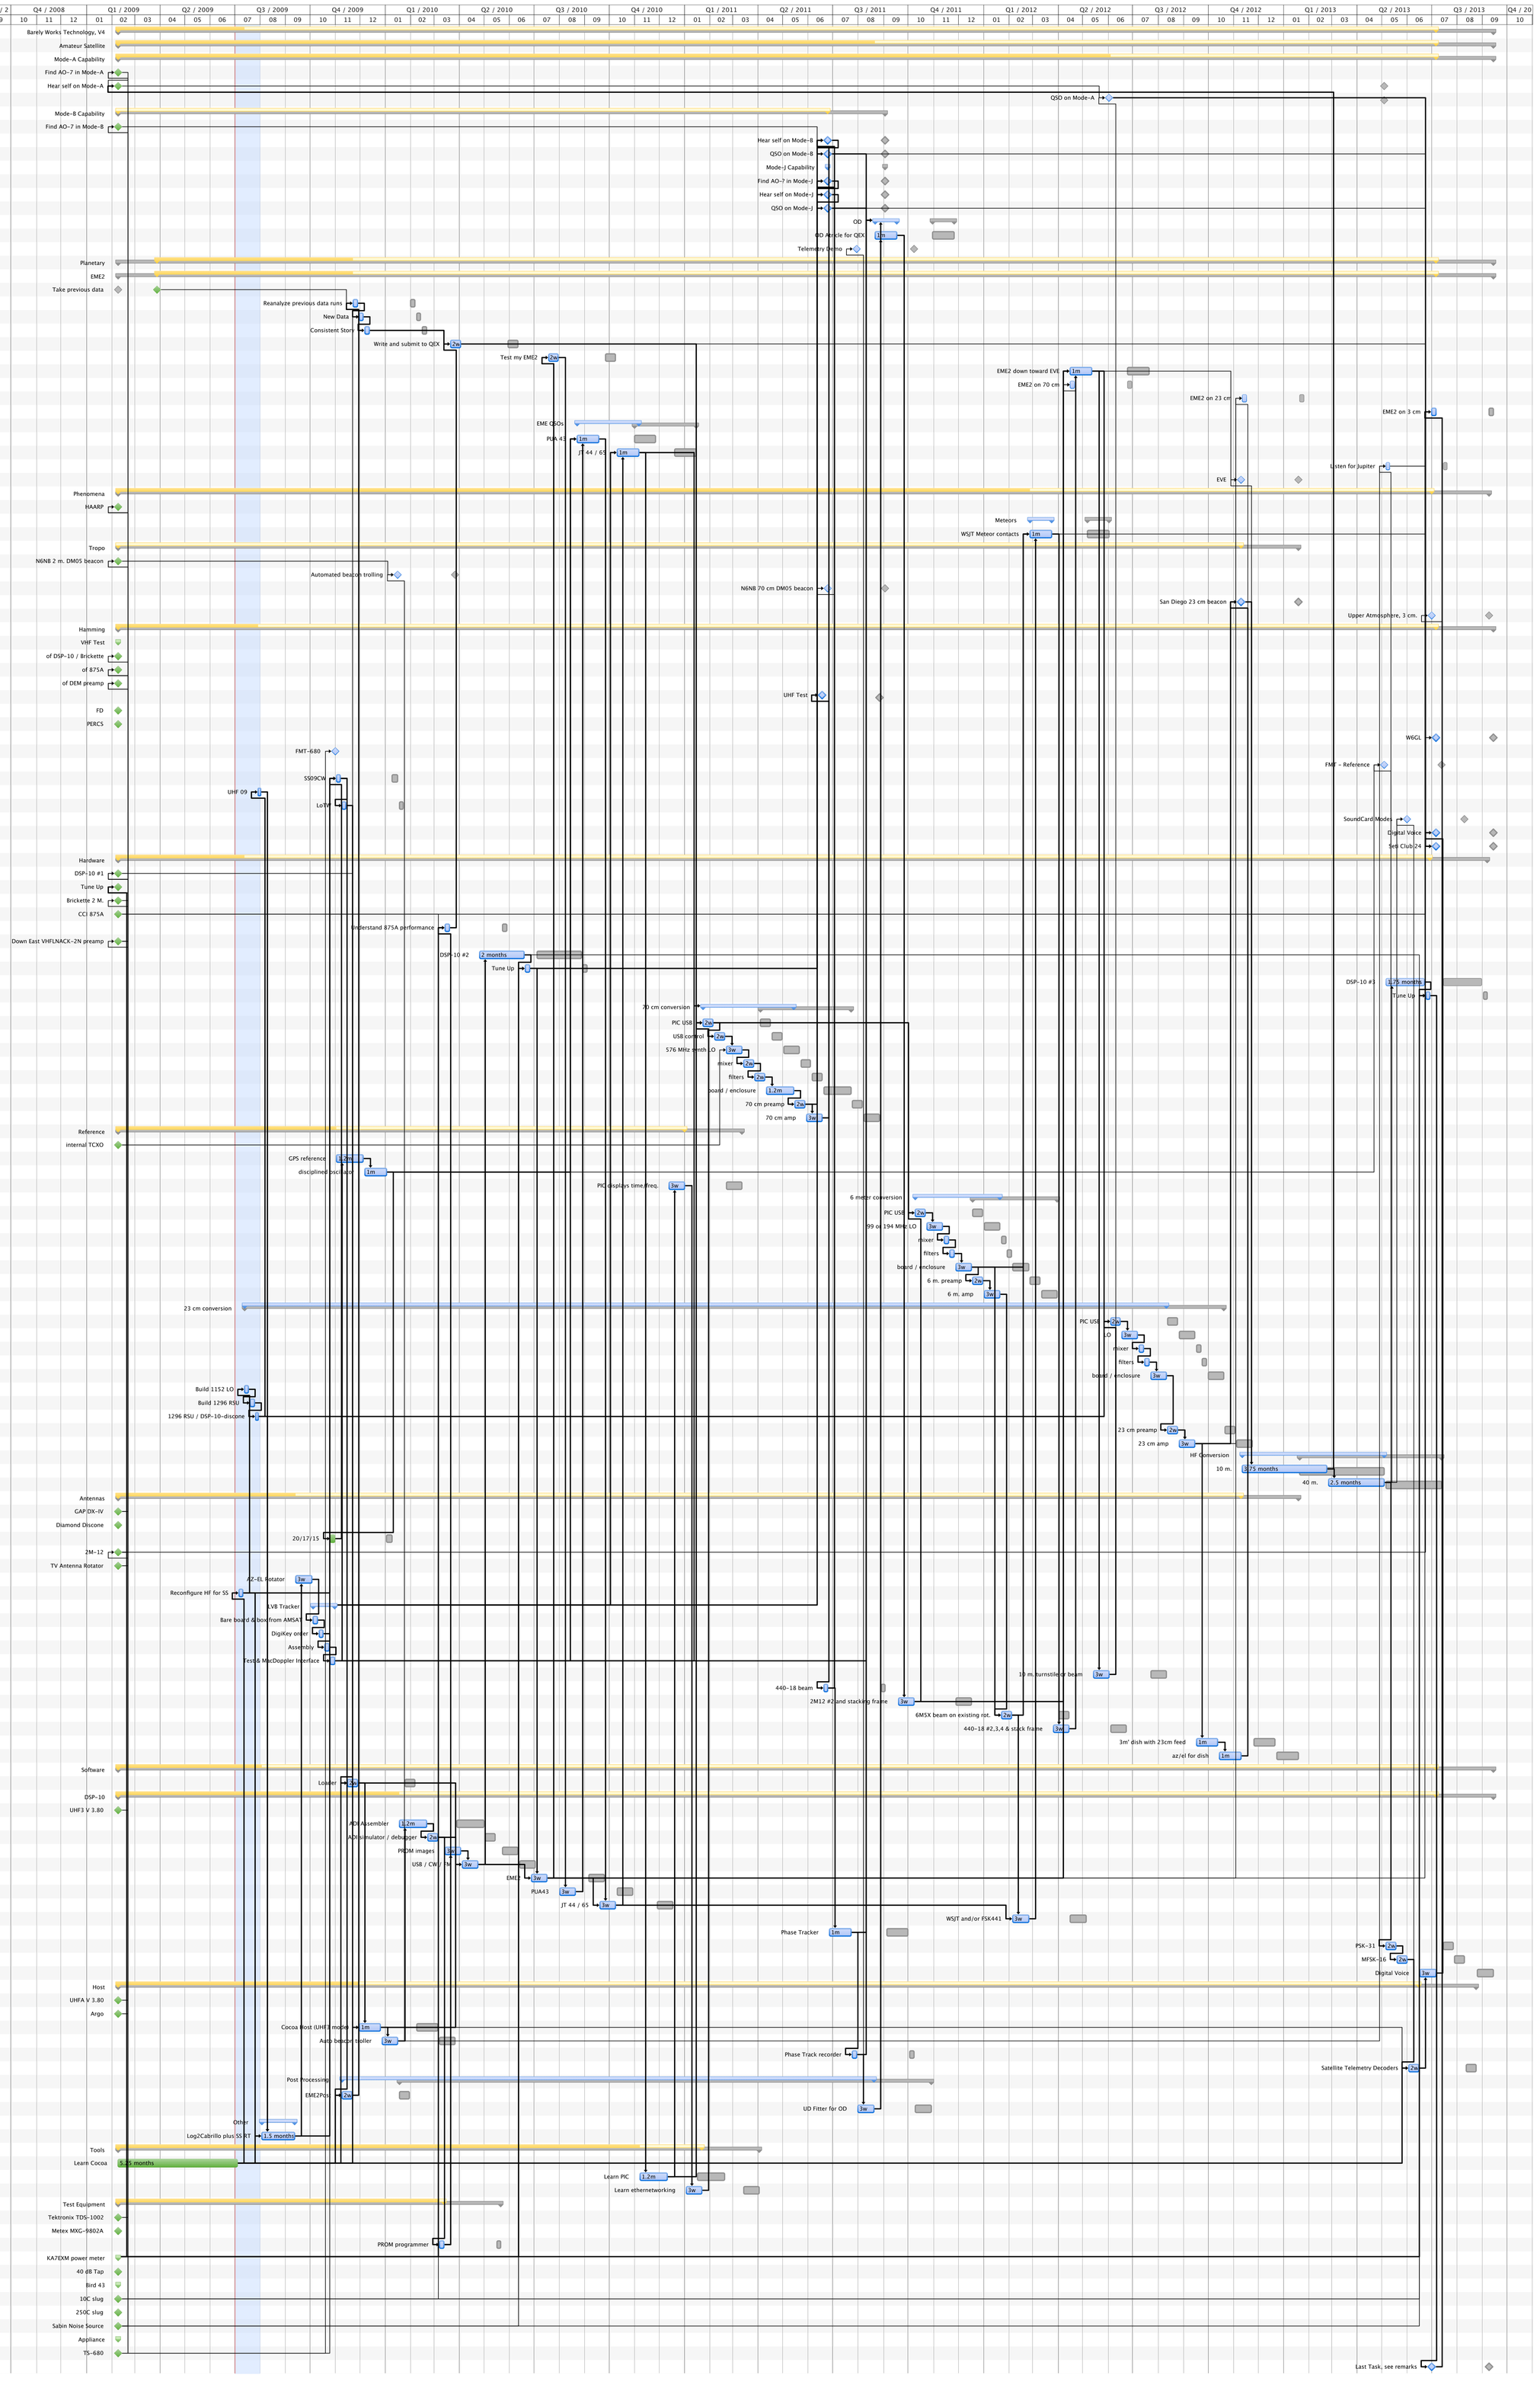#	Info	Title	Given Planned Work	Flag Status	# Predecessors	Expected Start	% Complete
0		**Barely Works Technology, V4**				2/9/09	9%
1		**Amateur Satellite**				2/9/09	55%
2		**Mode-A Capability**				2/9/09	67%
3		Find AO-7 in Mode-A			109; 171	2/9/09	100%
4		Hear self on Mode-A			3; 62; 64; 65; 67...	2/9/09	100%
5		QSO on Mode-A			4; 121	6/1/12	0%
6		**Mode-B Capability**				2/9/09	33%
7		Find AO-7 in Mode-B			67; 112	2/9/09	100%
8		Hear self on Mode-B			7; 69; 80; 122	6/24/11	0%
9		QSO on Mode-B			8	6/24/11	0%
10		**Mode-J Capability**				6/24/11	0%
11		Find AO-7 in Mode-J			79; 116; 122	6/24/11	0%
12		Hear self on Mode-J			11; 69	6/24/11	0%
13		QSO on Mode-J			12	6/24/11	0%
14		**OD**			**9; 13; 120; 140; ...**	8/22/11	0%
15		OD Article for QEX	4 weeks		153	8/22/11	0%
16		Telemetry Demo			149	7/29/11	0%
17		**Planetary**				3/27/09	0%
18		**EME2**				3/27/09	0%
19		Take previous data				3/27/09	100%
20		Reanalyze previous data runs	1 week		19; 152	11/23/09	0%
21		New Data	1 week		20; 62	11/30/09	0%
22		Consistent Story	1 week		21	12/7/09	0%
23		Write and submit to QEX	2 weeks		22; 66	3/22/10	0%
24		Test my EME2	2 weeks		136	7/19/10	0%
25		EME2 down toward EVE	4 weeks		123; 125; 136	4/16/12	0%
26		EME2 on 70 cm	1 week		125; 136	4/16/12	0%
27		EME2 on 23 cm	1 week		104; 127; 136	11/12/12	0%
28		EME2 on 3 cm	1 week		136; 172	7/1/13	0%
29		**EME QSOs**				8/23/10	0%
30		PUA 43	4 weeks		69; 84; 120; 137	8/23/10	0%
31		JT 44 / 65	4 weeks		116; 138	10/11/10	0%
32		Listen for Jupiter	1 week		107; 148	5/6/13	0%
33		EVE			25; 42	11/9/12	0%
34		**Phenomena**				2/9/09	0%
35		HAARP			109; 146; 171	2/9/09	100%
36		**Meteors**				2/27/12	0%
37		WSJT Meteor contacts	4 weeks		91; 124; 139	2/27/12	0%
38		**Tropo**				2/9/09	25%
39		N6NB 2 m. DM05 beacon			62; 112; 113	2/9/09	100%
40		Automated beacon trolling			39; 148	1/15/10	0%
41		N6NB 70 cm DM05 beacon			79; 122	6/24/11	0%
42		San Diego 23 cm beacon			104; 127	11/9/12	0%
43		Upper Atmosphere, 3 cm.			172	7/1/13	0%
44		**Hamming**				2/9/09	0%
45		**VHF Test**				2/9/09	100%
46		of DSP-10 / Brickette			62	2/9/09	100%
47		of 875A			62; 65; 112	2/9/09	100%
48		of DEM preamp			62; 67; 112	2/9/09	100%
49		UHF Test			80	6/17/11	0%
50		FD				2/9/09	100%
51		PERCS				2/9/09	100%
52		W6GL			65; 112	7/5/13	0%
53		FMT-680			171	11/1/09	0%
54		FMT - Reference			84; 107	5/3/13	0%
55		SS09CW	1 week		111; 115; 155; 171	11/2/09	0%
56		UHF 09	2 days		102	7/30/09	0%
57		LoTW	1 week		55	11/9/09	0%
58		SoundCard Modes			107; 142	5/31/13	0%
59		Digital Voice			143	7/5/13	0%
60		Seti Club 24			5; 9; 13; 23; 32; 37	7/5/13	0%
61		**Hardware**				2/9/09	0%
62		DSP-10 #1			82; 131; 145; 161	2/9/09	100%
63		Tune Up			164; 167; 169	2/9/09	100%
64		Brickette 2 M.			169	2/9/09	100%
65		CCI 875A				2/9/09	100%
66		Understand 875A performance	1 week		65; 163; 164; 167	3/15/10	0%
67		Down East VHFLNACK-2N p...			169	2/9/09	100%
68		DSP-10 #2	8 weeks		135	4/26/10	0%
69		Tune Up	1 week		68; 164; 167; 169	6/21/10	0%
70		DSP-10 #3	5 weeks		107	5/6/13	0%
71		Tune Up	1 week		68; 70; 164; 167...	6/24/13	0%
72		**70 cm conversion**			**31; 120**	1/24/11	0%
73		PIC USB	2 weeks		23; 158; 159	1/24/11	0%
74		USB control	2 weeks		73	2/7/11	0%
75		576 MHz synth LO	3 weeks		74; 82	2/21/11	0%
76		mixer	2 weeks		75	3/14/11	0%
77		filters	2 weeks		76	3/28/11	0%
78		board / enclosure	5 weeks		77	4/11/11	0%
79		70 cm preamp	2 weeks		78	5/16/11	0%
80		70 cm amp	3 weeks		79	5/30/11	0%
81		**Reference**				2/9/09	0%
82		internal TCXO				2/9/09	100%
83		GPS reference	5 weeks		120	11/2/09	0%
84		disciplined oscillator	4 weeks		83	12/7/09	0%
85		PIC displays time/freq.	3 weeks		158	12/13/10	0%
86		**6 meter conversion**				10/10/11	0%
87		PIC USB	2 weeks		73; 123	10/10/11	0%
88		99 or 194 MHz LO	3 weeks		87	10/24/11	0%
89		mixer	1 week		88	11/14/11	0%
90		filters	1 week		89	11/21/11	0%
91		board / enclosure	3 weeks		90	11/28/11	0%
92		6 m. preamp	2 weeks		91	12/19/11	0%
93		6 m. amp	3 weeks		92	1/2/12	0%
94		**23 cm conversion**				7/13/09	0%
95		PIC USB	2 weeks		25; 102; 121	6/4/12	0%
96		LO	3 weeks		95	6/18/12	0%
97		mixer	1 week		96	7/9/12	0%
98		filters	1 week		97	7/16/12	0%
99		board / enclosure	3 weeks		98	7/23/12	0%
100		Build 1152 LO	1 week		115	7/13/09	0%
101		Build 1296 RSU	1 week		100	7/20/09	0%
102		1296 RSU / DSP-10-discone	3 days		101	7/27/09	0%
103		23 cm preamp	2 weeks		99	8/13/12	0%
104		23 cm amp	3 weeks		103	8/27/12	0%
105		**HF Conversion**				11/12/12	0%
106		10 m.	15 weeks		42	11/12/12	0%
107		40 m.	10 weeks		106	2/25/13	0%
108		**Antennas**				2/9/09	3%
109		GAP DX-IV				2/9/09	100%
110		Diamond Discone				2/9/09	100%
111		20/17/15	1 week		84	10/26/09	100%
112		2M-12			113	2/9/09	100%
113		TV Antenna Rotator				2/9/09	100%
114		AZ-EL Rotator	3 weeks		155	9/14/09	0%
115		Reconfigure HF for SS	1 week		157	7/6/09	0%
116		**LVB Tracker**				10/5/09	0%
117		Bare board & box from A...	1 week		114	10/5/09	0%
118		DigiKey order	1 week		117	10/12/09	0%
119		Assembly	1 week		118	10/19/09	0%
120		Test & MacDoppler Interface	1 week		119	10/26/09	0%
121		10 m. turnstile or beam	3 weeks		25	5/14/12	0%
122		440-18 beam	1 week		80	6/20/11	0%
123		2M12 #2 and stacking frame	3 weeks		15	9/19/11	0%
124		6M5X beam on existing rot.	2 weeks		91; 93	1/23/12	0%
125		440-18 #2,3,4 & stack frame	3 weeks		37	3/26/12	0%
126		3m' dish with 23cm feed	4 weeks		104	9/17/12	0%
127		az/el for dish	4 weeks		126	10/15/12	0%
128		**Software**				2/9/09	24%
129		Loader	2 weeks		57; 157	11/16/09	0%
130		**DSP-10**				2/9/09	0%
131		UHF3 V 3.80				2/9/09	100%
132		ADI Assembler	5 weeks		148	1/18/10	0%
133		ADI simulator / debugger	2 weeks		132	2/22/10	0%
134		PROM images	3 weeks		163	3/15/10	0%
135		USB / CW / FM	3 weeks		129; 133; 134; 147	4/5/10	0%
136		EME2	3 weeks		69; 135	6/28/10	0%
137		PUA43	3 weeks		24	8/2/10	0%
138		JT 44 / 65	3 weeks		30; 136	9/20/10	0%
139		WSJT and/or FSK441	3 weeks		124; 138	2/6/12	0%
140		Phase Tracker	4 weeks		122	6/27/11	0%
141		PSK-31	2 weeks		107	5/6/13	0%
142		MFSK-16	2 weeks		141	5/20/13	0%
143		Digital Voice	3 weeks		150	6/17/13	0%
144		**Host**				2/9/09	0%
145		UHFA V 3.80				2/9/09	100%
146		Argo				2/9/09	100%
147		Cocoa Host (UHF3 mode)	4 weeks		57; 129; 157	11/30/09	0%
148		Auto beacon troller	3 weeks		147	12/28/09	0%
149		Phase Track recorder	1 week		140	7/25/11	0%
150		Satellite Telemetry Decoders	2 weeks		142; 147; 157	6/3/13	0%
151		**Post Processing**				11/9/09	0%
152		EME2Post	2 weeks		55; 157	11/9/09	0%
153		UD Fitter for OD	3 weeks		149	8/1/11	0%
154		**Other**				8/3/09	0%
155		Log2Cabrillo plus SS RT	6 weeks		56; 102; 115; 157	8/3/09	0%
156		**Tools**				2/9/09	72%
157		Learn Cocoa	21 weeks			2/9/09	100%
158		Learn PIC	5 weeks		31	11/8/10	0%
159		Learn ethernetworking	3 weeks		85	1/3/11	0%
160		**Test Equipment**				2/9/09	0%
161		Tektronix TDS-1002				2/9/09	100%
162		Metex MXG-9802A				2/9/09	100%
163		PROM programmer	1 week		133	3/8/10	0%
164		**KA7EXM power meter**				2/9/09	100%
165		40 dB Tap				2/9/09	100%
166		**Bird 43**				2/9/09	100%
167		10C slug				2/9/09	100%
168		250C slug				2/9/09	100%
169		Sabin Noise Source				2/9/09	100%
170		**Appliance**				2/9/09	100%
171		TS-680				2/9/09	100%
172		Last Task, see remarks			71	7/1/13	0%
